


## **Zpráva o realizaci 1. etapy odvozu odpadů z lokality Arnoltice (Bulovka)**

V listopadu 2013 proběhlo v Liberci a Arnolticích jednání se zástupci agentury SAA (Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH), německého kompetentního úřadu pro řešení nelegálních přeprav odpadů, kde se zástupci SAA zavázali, že zajistí, tedy i finančně, odstranění množství cca 45% odpadů v termínu do konce června 2014 (1. etapa). Závazek agentury SAA se týkal odvozu a likvidace odpadů z halových prostor označených písmenem A, B, C a E, z meziprostor mezi halou B-C a C-D, ze sektoru I a částečně ze sektoru J. Podkladem pro realizaci odvozu odpadů z lokality byl projekt zpracovaný společností CZ BIJO a.s.

Lisované balíky a volně ložený materiál byly vyváženy z hal na volné prostranství před budovy. Zde byly svázané balíky strojně, nebo ručně přezávány a následně nakládány do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery byly po ukončení nakládky ihned překryty plachtou (sítí), tak aby se zabránilo jejich uvolňování z kontejneru. Odpady byly následně odváženy v soupravě po dvou kontejnerech na spalovnu společnosti TERMIZO a.s. Pro nakládku a převoz bylo k dispozici šest kontejnerů o objemu cca 36 m<sup>3</sup>. Přepravu v soupravě zajišťovaly dva nákladní vozy. Průměrná váha na jeden kontejner činila cca 7 tun.

1. etapa likvidace odpadů byla úspěšně dokončena dne 17. dubna 2014. Celkem bylo do spalovny společnosti TERMIZO a.s. odvezeno k energetickému využití 4 499 tun odpadu. Z toho bylo 3 523 tun odpadu katalogového čísla 191212 (plasty) a 976 tun odpadu katalogového čísla 040222 (textil). Vlastní nakládku odpadů, jejich přepravu do spalovny a úklid dotčených ploch v místě prováděla společnost SITA CZ a.s. Supervize, kterou zajišťovala společnost CZ BIJO a.s., potvrdila splnění cílů a rozsahu zakázky v souladu s technickým prováděcím projektem. Všechny vyčištěné prostory byly předány k užívání jejich vlastníkov XXXXXXXXXX (Uhelné sklady Arnoltice s.r.o.). Dle sdělení zástupce agentury SAA náklady na realizaci 1. etapy odvozu odpadů činily 320 tisíc EUR.

Závěrečný kontrolní den se uskutečnil dne 29. dubna 2014 respektive 14. května 2014 za účasti zástupců německé agentury SAA, kdy byla předána závěrečná zpráva a lokalita byla do realizace další etapy odvozu odpadů protokolárně uzavřena. Zbývající odpady dotčených ploch 1. etapy kategorie ostatní zůstaly na určených místech pro 2. etapu projektu financovanou českou stranou.

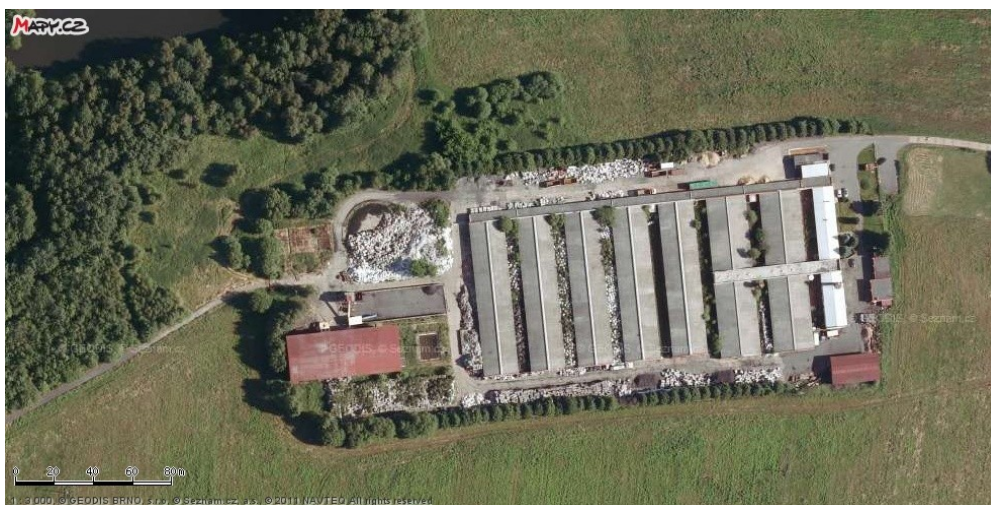

**Obr: Ortofotomapa dotčeného území – zdroj: [www.mapy.cz](http://www.mapy.cz)**

## **Bilance odvezených odpadů:**

### Sektor I:

Veškerý odpad byl odvezen na spalovnu, prostor je vyklizený, čistý. Do místa byl přesunut odpad z hal kategorie ostatní dle zadání v projektu. Tento odpad bude zlikvidován v rámci plánované 2. etapy. Bylo odvezeno: 70 tun

### Sektor J:

Z prostoru byl odvezen veškerý odpad, který bylo možné energeticky využít na spalovně TERMIZO a.s. V prostoru zůstaly odpady, které neumožňuje technologie spalovny zpracovat a které zároveň nebyly součástí 1. etapy. Bylo odvezeno: 1142 tun

### Meziprostor B-C:

Z meziprostoru byl odvezen veškerý odpad na spalovnu, meziprostor je prázdný, čistý a předaný k užívání. Bylo odvezeno: 507 tun

### Meziprostor C-D:

Z meziprostoru byl odvezen veškerý odpad na spalovnu, meziprostor je prázdný, čistý a předaný k užívání. Bylo odvezeno: 504 tun

### Hala A:

Z haly byl odvezen veškerý odpad na spalovnu, hala je prázdná, čistá, předaná k užívání. Odpady z hal, které nebyly součástí 1. etapy likvidace, byly přesunuty v souladu s projektem do vyčištěného sektoru I. Bylo odvezeno: 930 tun

### Hala B:

Z haly byl odvezen veškerý odpad na spalovnu, hala je prázdná, čistá, předaná k užívání. Odpady z hal, které nebyly součástí 1. etapy likvidace, byly přesunuty v souladu s projektem do vyčištěného sektoru I. Bylo odvezeno: 603 tun

### Hala C:

Z haly byl odvezen veškerý odpad na spalovnu, hala je prázdná, čistá, předaná k užívání. Odpady z hal, které nebyly součástí 1. etapy likvidace, byly přesunuty v souladu s projektem do vyčištěného sektoru I. Bylo odvezeno: 646 tun

### Hala E:

Z haly byl odvezen veškerý odpad na spalovnu, hala je prázdná, čistá, předaná k užívání. Odpady z hal, které nebyly součástí 1. etapy likvidace, byly přesunuty v souladu s projektem do vyčištěného sektoru I. Bylo odvezeno: 97 tun

## Fotodokumentace:



Foto č.1 - Sektor I - začátek odvozu



Foto č.2 - Sektor I - vyčištěný prostor



Foto č.3 - meziprostor B-C - původní stav



Foto č.4 - meziprostor B-C - vyčištěná plocha



Foto č.5 - meziprostor C-D - původní stav



Foto č.6 - meziprostor C-D - vyčištěná plocha





Foto č.7 – hala C – původní stav



Foto č.8 – hala C – vyvezená hala



Foto č.9 – Vyvážení balíků z haly



Foto č.10 – Nakládka odpadů do kontejneru



Foto č.11 – Vykládka na spalovně Termizo a.s
